Deckenprogramm 2021/22
Kreis Steinburg
K 57 – Abschnitt 10 und 20

Ansprechpartner Kreis:	Herr Naser naser@steinburg.de
Ansprechpartner Ing. Büro:	Herr Fink tim.fink@ing-reese-wulff.de

Bürgerinformation

Übersicht

1 Überblick über die Gesamtmaßnahme
2 Vorgesehene Arbeiten
3 Geplante Umleitungen
4 Sonstiges

1 Überblick über die Gesamtmaßnahme

Bauabschnitt 1:

OD Peissen

Kreuzung Hauptstraße/
Obere Dorfstraße bis

Einmündung Am Osterdeich

Voraussichtliche Bauzeit:

(ca. 3 Wochen)

Bauabschnitt 2:

Einmündung Am Osterdeich
bis Kreuzung B 77

Voraussichtliche Bauzeit:

(ca. 2 Wochen)

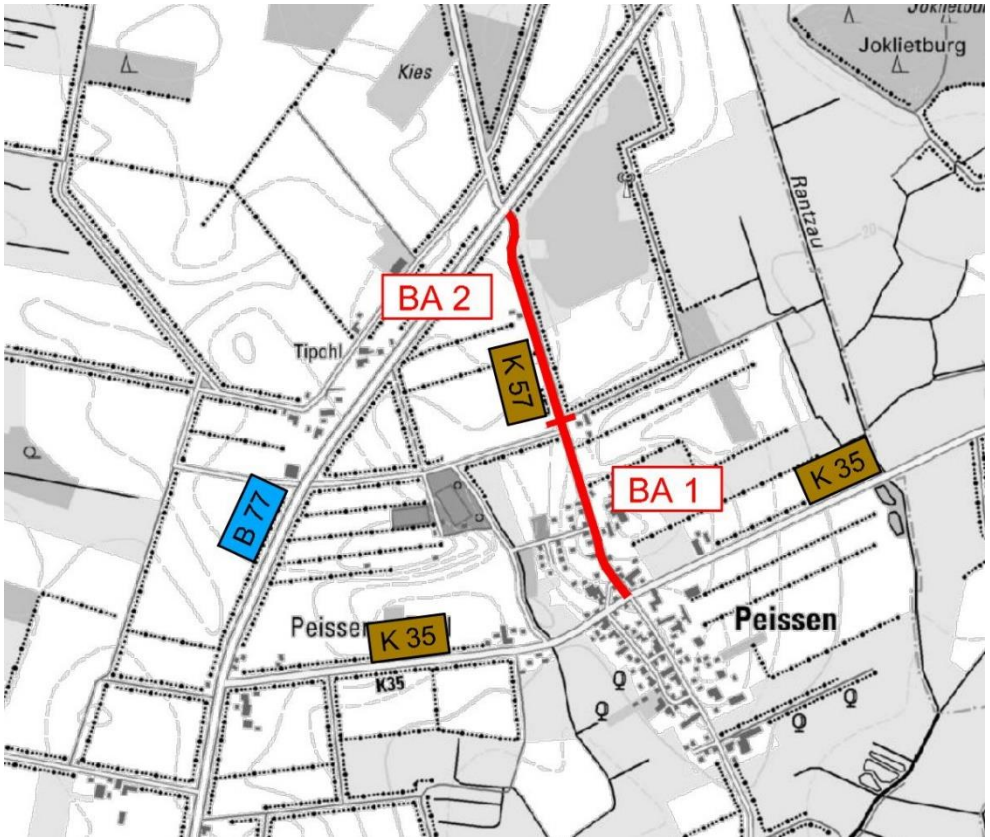

1 Überblick über die Gesamtmaßnahme

Bauabschnitt 3:

Kreuzung B 77 bis zur Kiesgrube

Voraussichtliche Bauzeit:

(ca. 2 Wochen)

Bauabschnitt 4:

Von der Kiesgrube bis Biogasanlage

Voraussichtliche Bauzeit:

(ca. 5 Wochen)

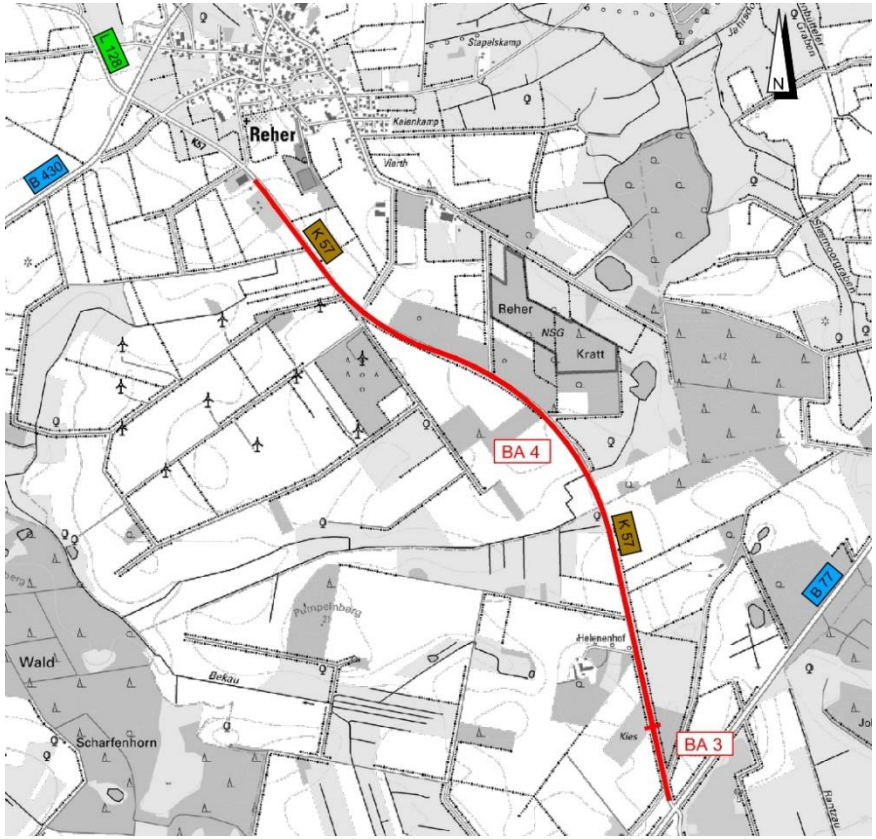

1 Überblick über die Gesamtmaßnahme

Bauabschnitt 5:

Biogasanlage bis zur Kreuzung B 430

Voraussichtliche Bauzeit:

(ca. 2 Wochen)

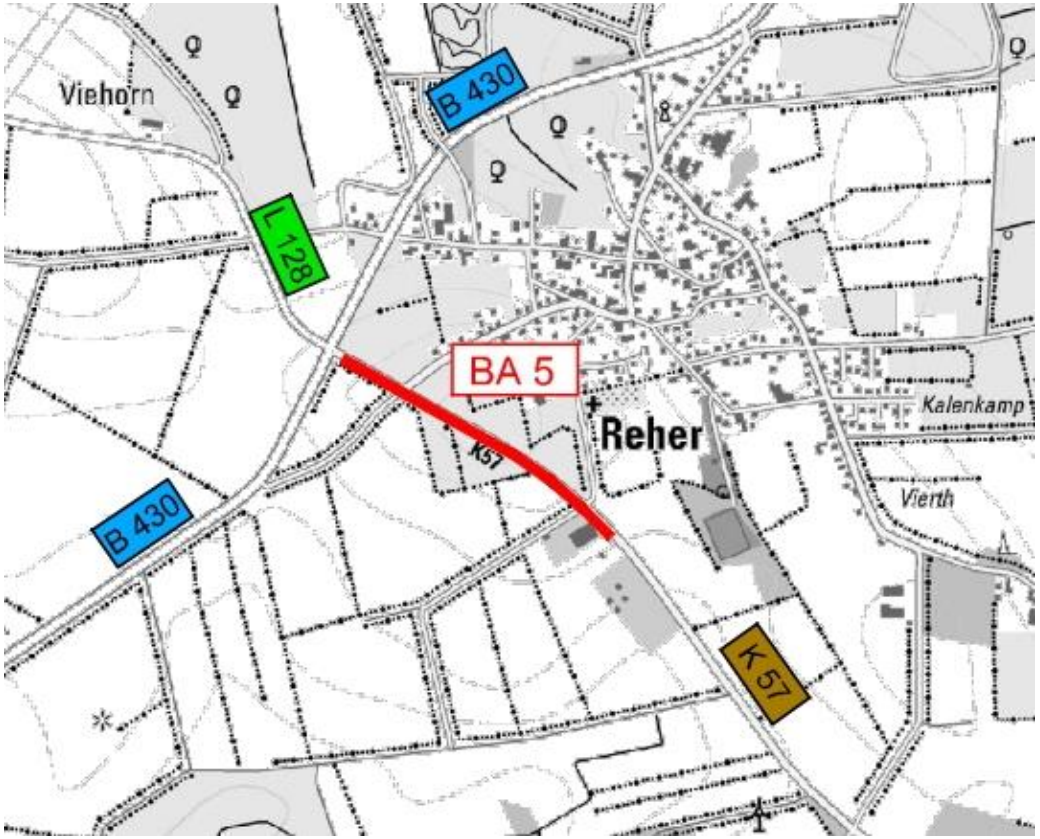

2 Vorgesehene Arbeiten

Deckensanierung

- Baustrecke: rd. 5655 m
- Fünf Bauabschnitte (500 m; 510 m; 370 m; 3550 m; 725 m)

gesamte Baustrecke

- Erneuerung der Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht (ca. 10 cm) in voller Fahrbahnbreite

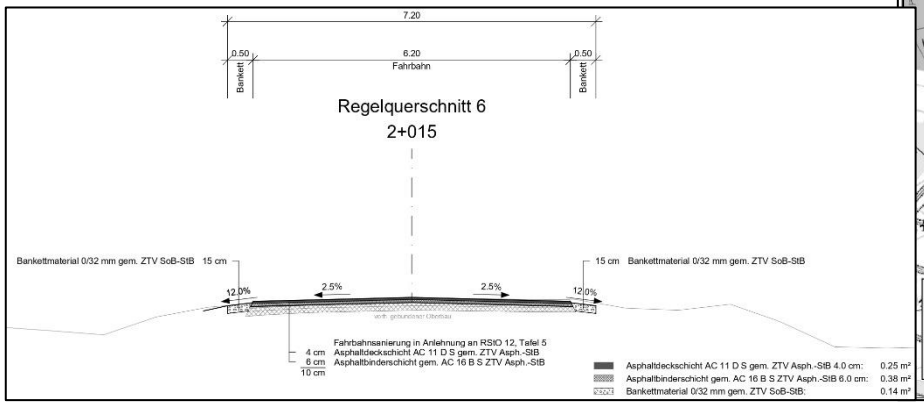

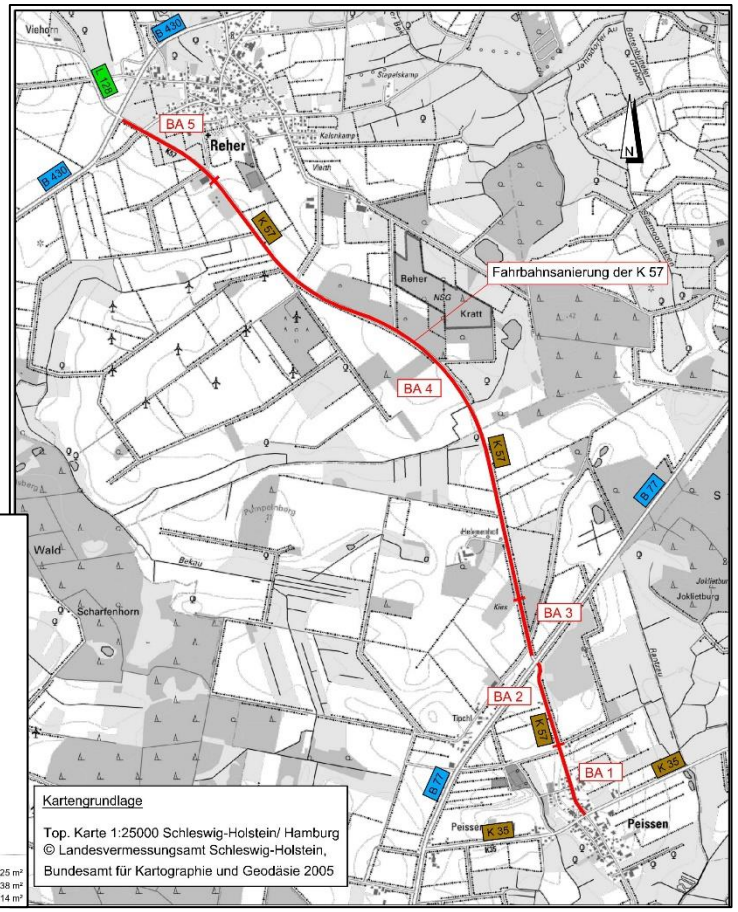

2 Vorgesehene Arbeiten

Deckensanierung innerorts

- Baustrecke: rd. 300 m

Bauabschnitt 1

- Fräsen der vorh. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten
- Regulierung von Straßenabläufen und Schachtabdeckungen
- Einbau der neuen Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht



Deckensanierung außerorts

- Baustrecke: rd. 5450 m

Bauabschnitt 2 bis 5 (Bauabschnitt 1)

- Vorh. Bankette ausbauen
- Fräsen der vorh. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten
- Einbau der neuen Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht
- Bankette herstellen



3 Geplante Umleitung Bauabschnitt 1 und 2

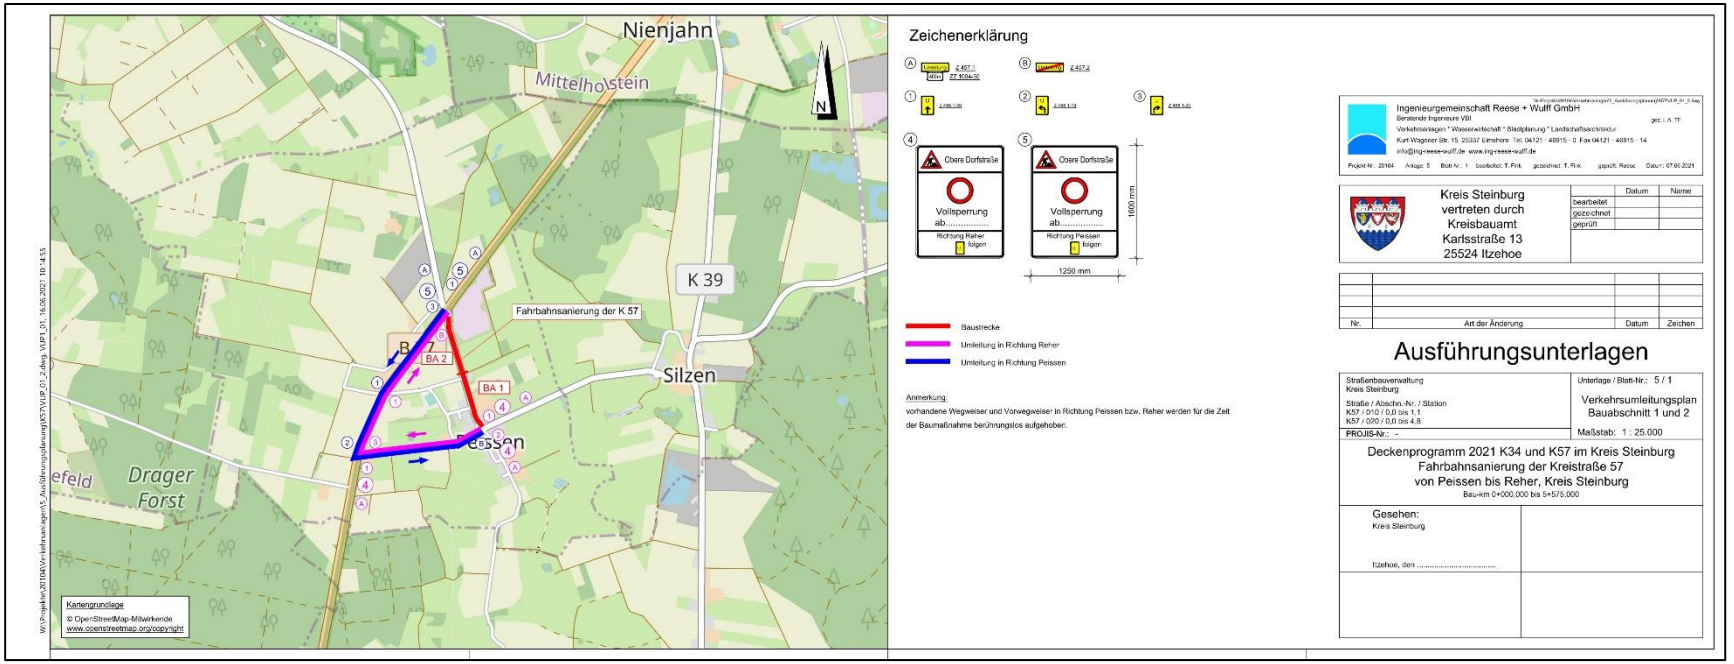

3 Geplante Umleitung Bauabschnitt 3 bis 5

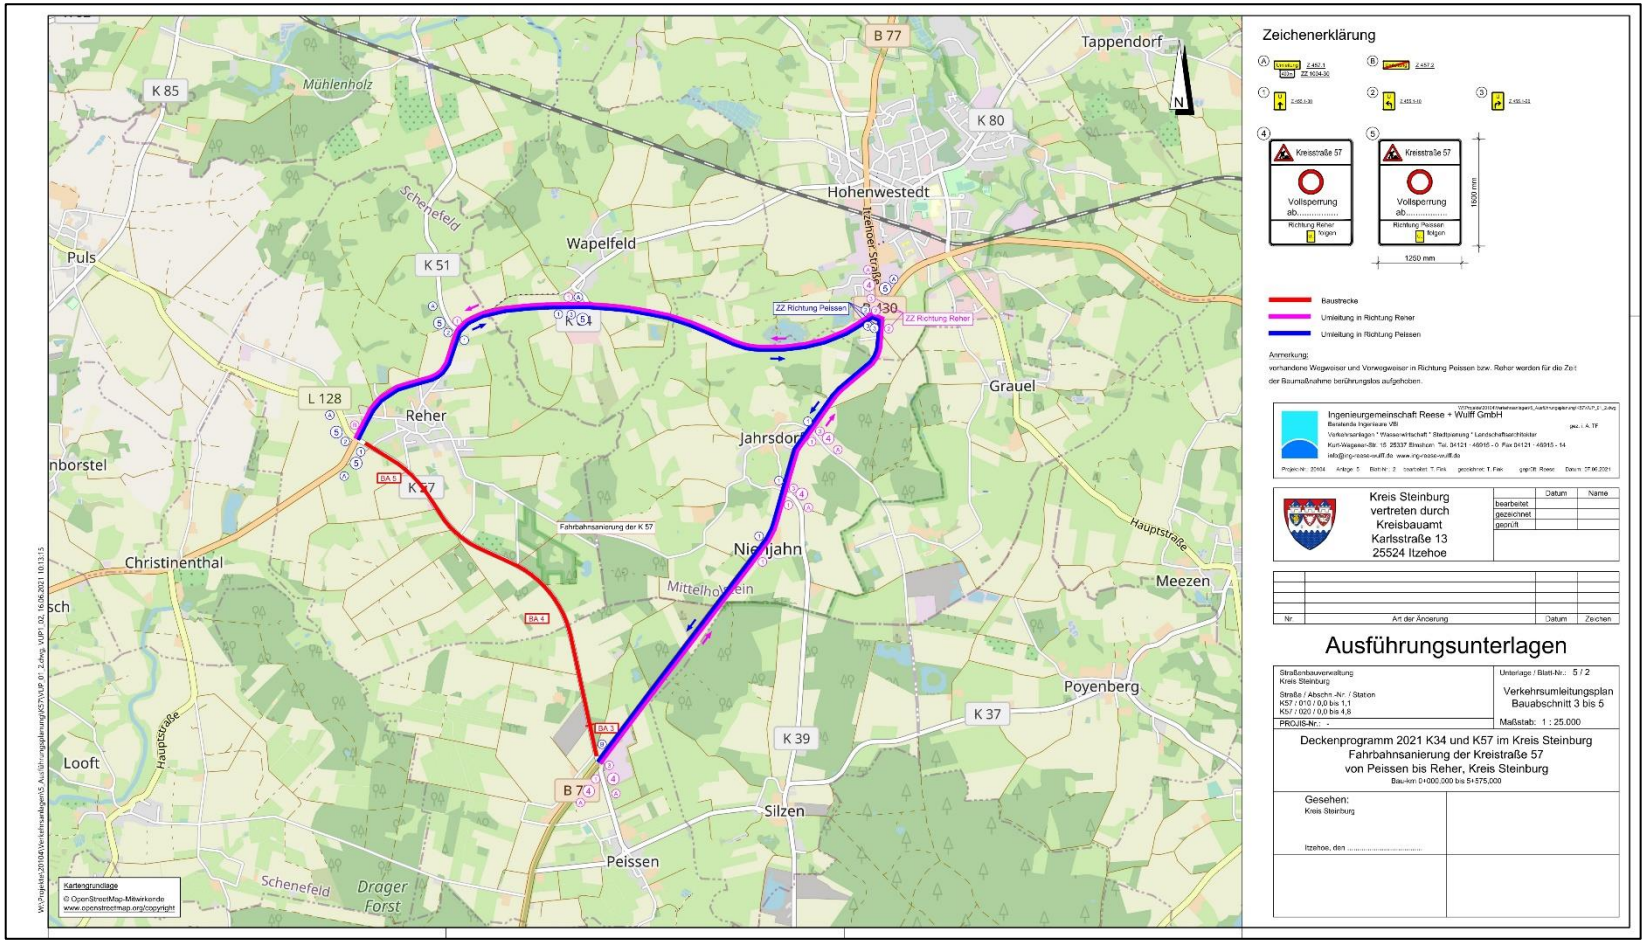

4 Sonstiges

Verkehrsführung im Baustellenbereich

- Unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit sowie des Arbeitsschutzes werden die beidseitig verlaufenden Gehwege im Bereich der OD Peissen aufgrund ihrer geringen Breiten ebenfalls voll gesperrt.

Müllabfuhr

- Die Mülltonen bzw. - säcke werden morgens von der Baufirma an einem Müllsammelplatz gesammelt und nach der Abfuhr zu den jeweiligen Haushalten zurückgebracht.
